PADELMAK

PADELMAK SPOR TESİSLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

KURULUM KILAVUZU

PADEL VISTA COURT

PADELMAK

PADELMAK SPOR TESİSLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

PADEL VISTA COURT

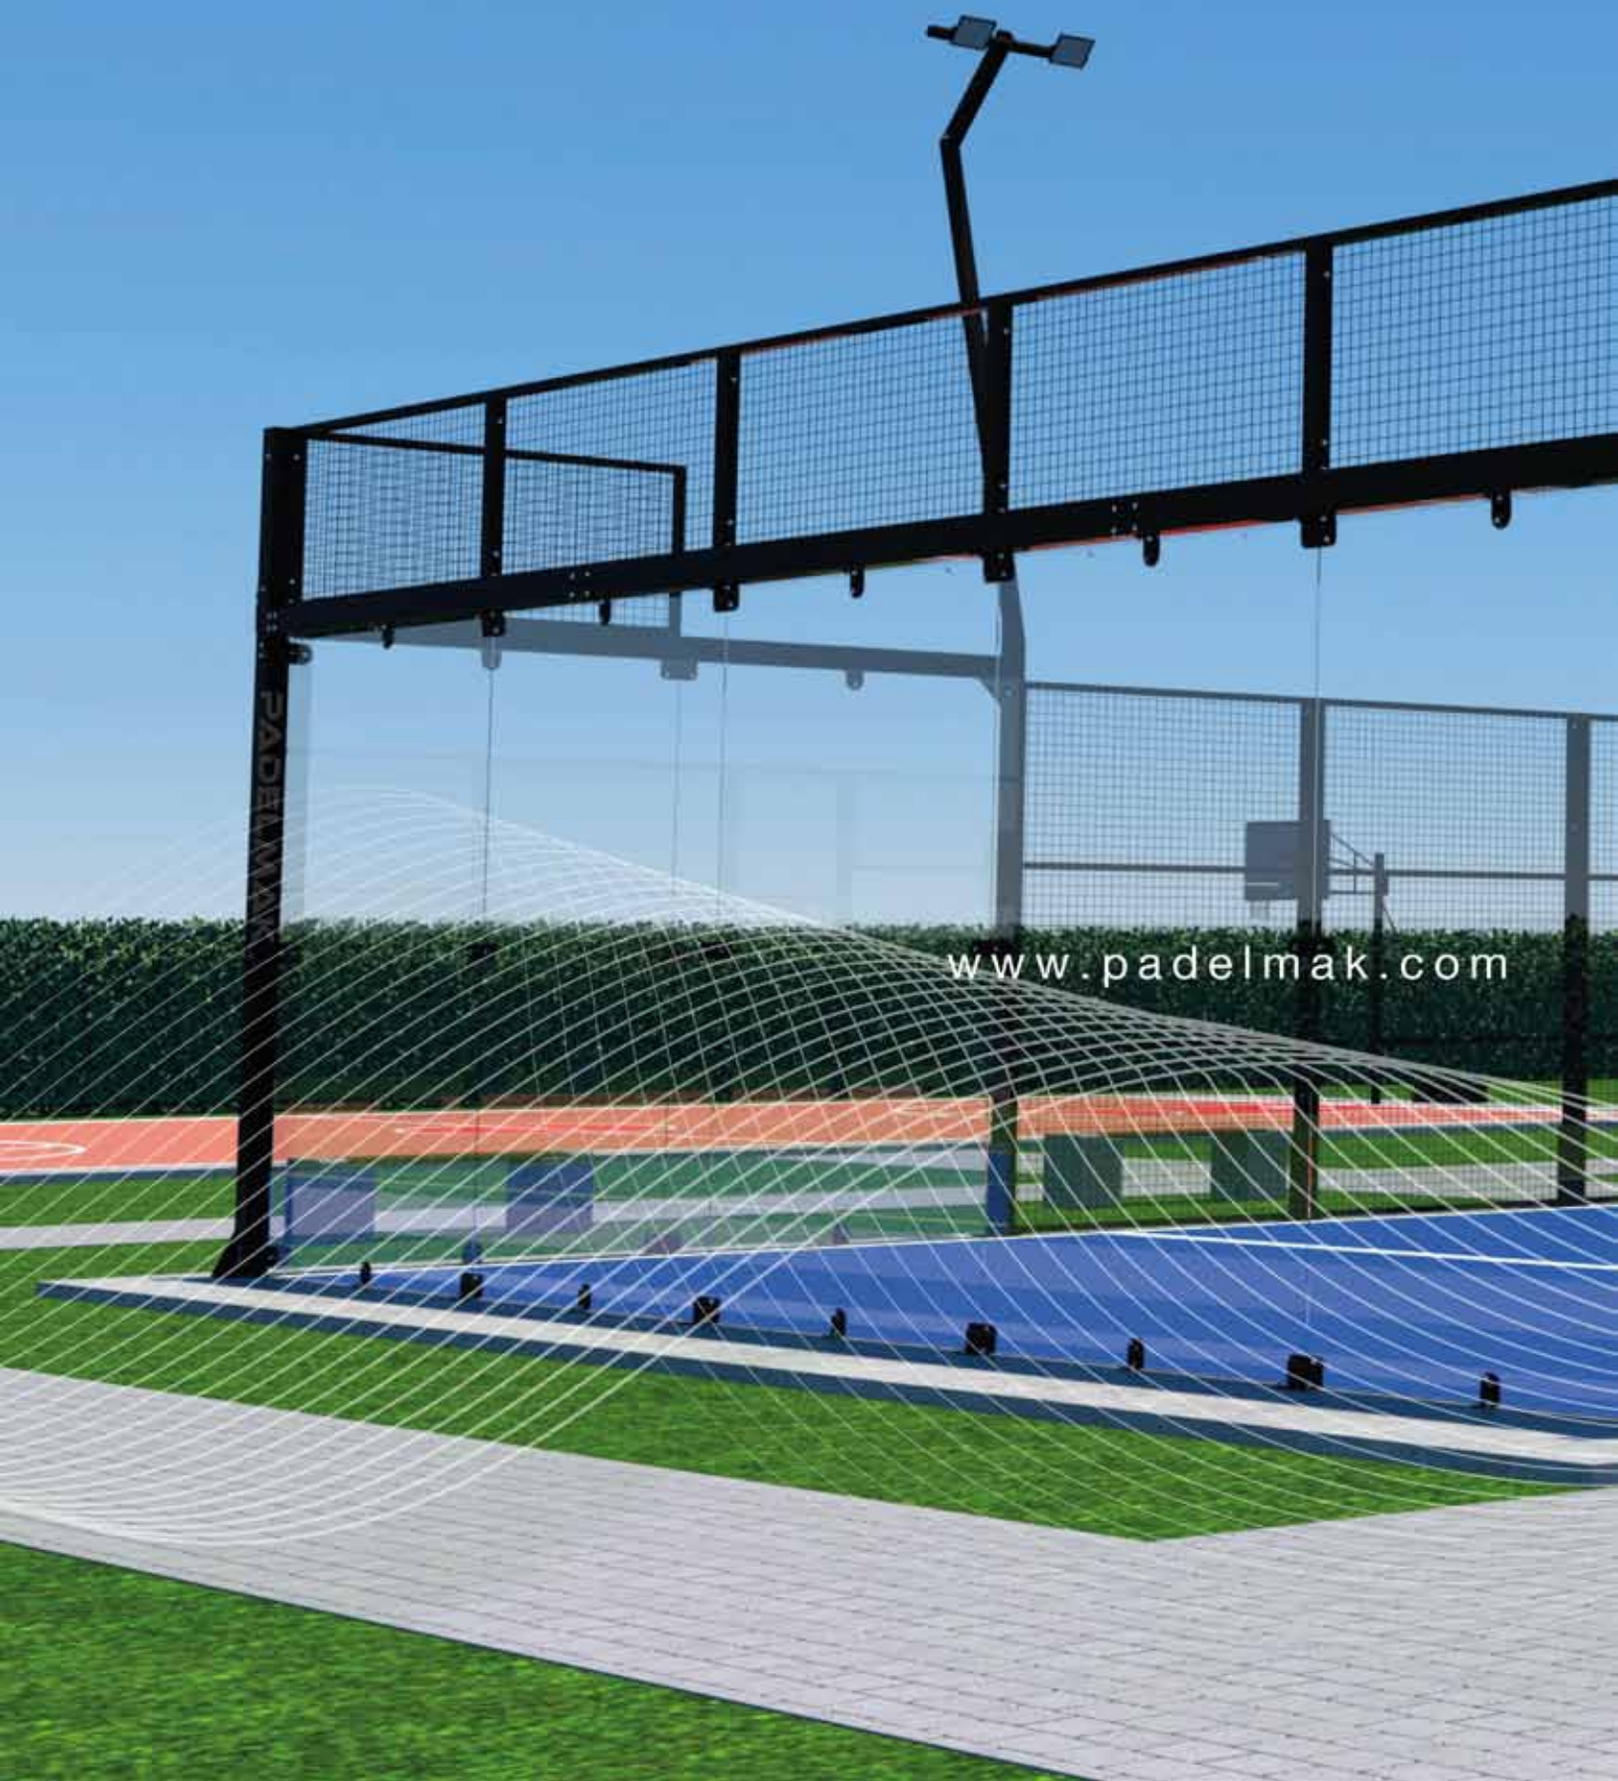

www.padelmak.com

PADEL VISTA COURT

PADELMAK



4-5 Uyarılar
6-9 Bağlantı Elemanları
10-15 Montaj

www.padelmak.com



UYARILAR

- Malzeme paletleri ve paketleri boşaltma sırasında kontrol edilmelidir. Hasarlı veya uygun olmayan palet ve paketler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı gözetiminde dikkatle indirilmelidir.
- Palet ve paketler uygun ekipman kullanılarak alttan taşınmalıdır.
- Montajdan önce kurulum kılavuzundaki bilgiler dikkatle okunmalı; kurulum kılavuzdaki talimatlara uygun yapılmalıdır.
- Montajdan önce parçalar tek tek kontrol edilmelidir. Kırık, kaynaklı veya aşırı eğilmiş parçalar kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Montaj personelinin ve çevredeki kişilerin güvenliği için uygun çalışma yöntemleri ve koruyucu ekipmanlar (emniyet kemeri, halat, baret, çelik burunlu ayakkabı, gözlük, eldiven vb.) sağlanmalıdır.
- Montaj alanı ve düşme tehlikesi bulunan bölgeler, monte edilen ürünlerin düşme riskine karşı güvenli hâle getirilmelidir.
- Montajı tamamlanan ürünler görsel ve elle kontrol edilmeli; uygunsuz montajlar (boşluk, sallanma, eğiklik vb.) düzeltilmelidir.
- Ürünler amacı dışında kullanılmamalıdır.



BAKIM, ONARIM VE DEPOLAMA TALİMATLARI

- Malzemelerin neredeyse tamamının hammaddesi çelik olduğundan ürünler su bulunan veya aşırı nemli ortamlarda depolanmamalıdır.
- Hasarlı kaplama ve boya uygun kaplama malzemesiyle onarılabilir. Bu işlemler için üreticiden danışmanlık desteği alınmalıdır.
- Kırık, aşınmış veya kullanılmış dübeller yeniden kullanılmamalıdır.
- Deforme olmuş ürünlerin düzeltilmesi ve yeniden kullanılması yetkili personel gözetiminde yapılmalıdır. Kullanıma uygun değilse kullanılmamalıdır.
- Ürünler kapalı alanda, dış hava koşullarından doğrudan etkilenmeyecek şekilde depolanmalıdır.
- Açık alanda depolanan ürünlerin üzeri branda, naylon vb. ile örtülmelidir.
- Ürünler depolama alanından taşınırken (forklift, kule vinç vb.) paketlerin altından kaldırılmalıdır.

PADELMAK

PADELMAK SPOR TESİSLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

MONTAJ



www.padelmak.com

PADEL VISTA COURT

PARÇALAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI

PIECE: 4

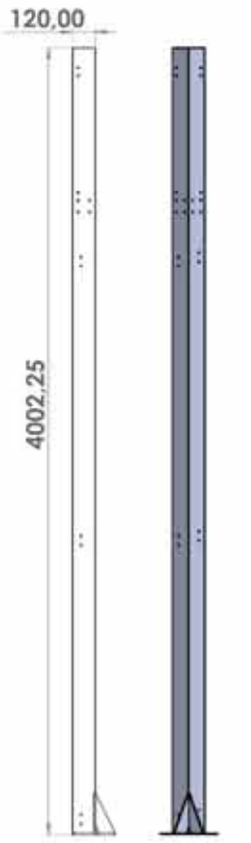

PART CODE: KD

PIECE: 16



PART CODE: D1

PIECE: 4

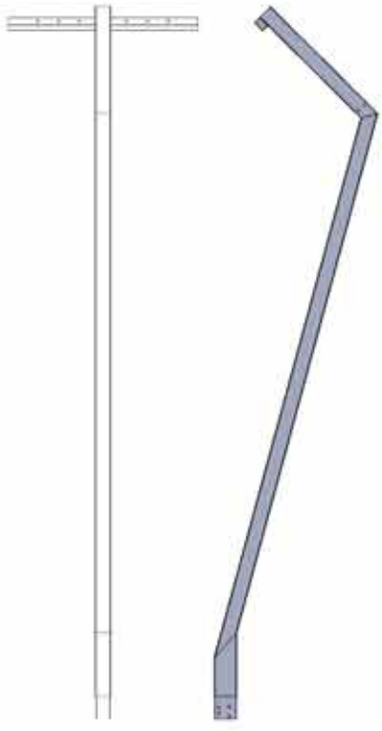

PART CODE: ID

PIECE: 1 | 1

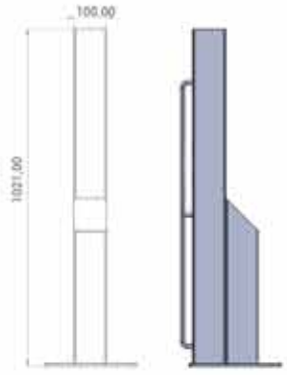

PART CODE: FD1 | FD2

PIECE: 10

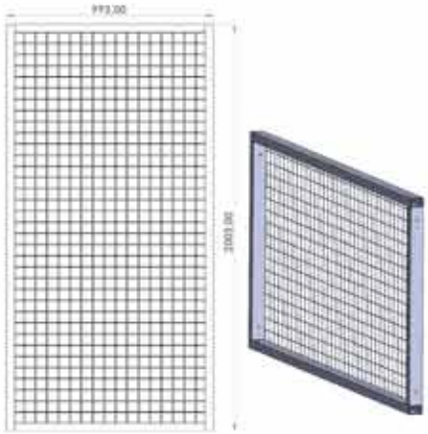

PART CODE: PNL100X200

PIECE: 4

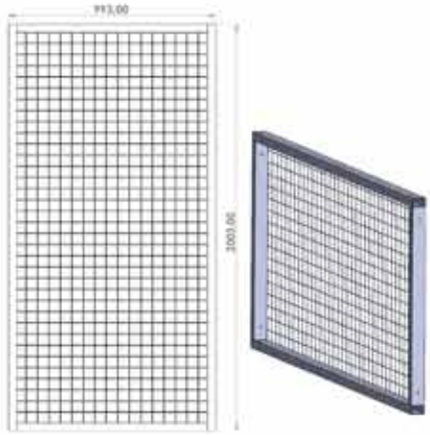

PART CODE: PNL100X200 V2

PIECE: 2

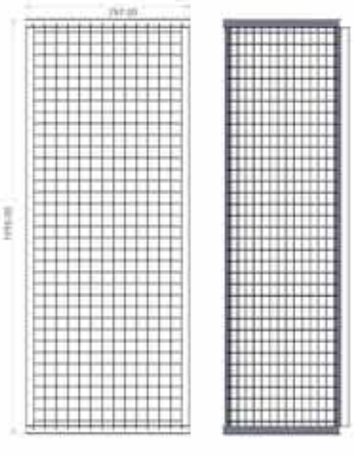

PART CODE: PNL 80X200

PARÇALAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI

PIECE: 12





PART CODE: CTB3

PIECE: 60





PART CODE: CTB2

PIECE: 24



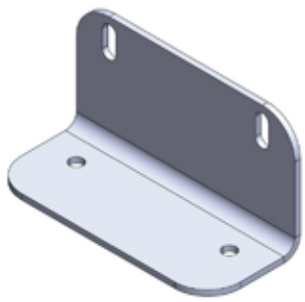

PART CODE: CTB1

PIECE: 4

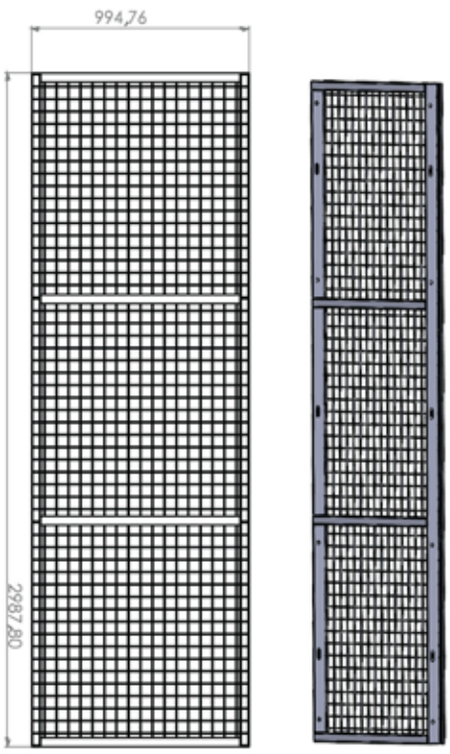

PART CODE: PNL 100X300

PIECE: 8

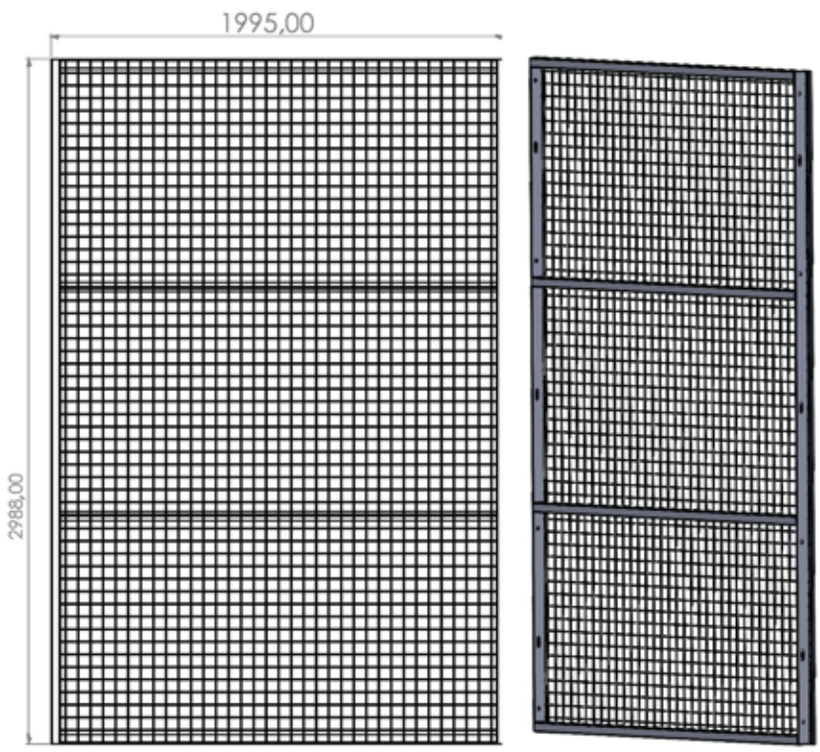

PART CODE: PNL 200X300

PARÇALAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI

PIECE 18

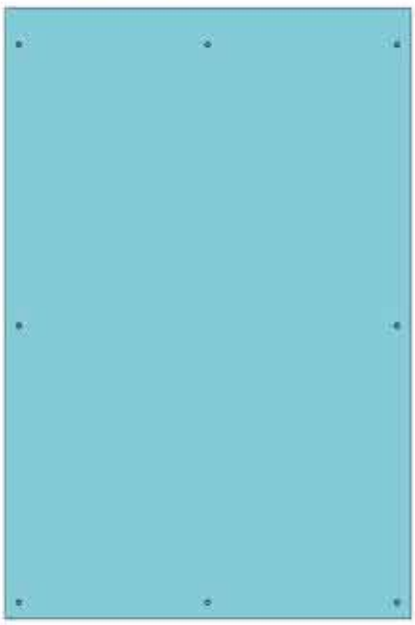

PART CODE GLASS 200X300

PIECE 4



PART CODE BP1

PIECE 4



PART CODE BP2

PIECE 2



PART CODE BP3

PIECE 4





PART CODE BPP1

PIECE 4

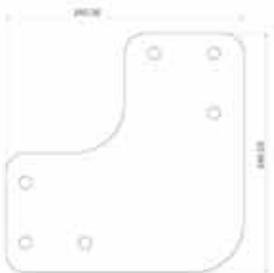



PART CODE BPP2

PIECE 8





PART CODE BPP3

PIECE 12





PART CODE CTB4

PARÇALAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI

CONNECTION PARTS

SIZE	PIECE
M10X60	16
M10X100	160
M10X120	48
M10X140	56
M10X160	56
M10X180	16

PIECE: 144



PART CODE: PDL-M10X30
COUTERSUK BOLT

PIECE: 156



PART CODE: PDL-M14X110
STEEL DOWEL



PART CODE: PDL-M10
BOLT

PIECE: 496



PART CODE: PDL-M10

PIECE: 848



PART CODE: M10
COVER

PIECE: 496



PART CODE: M10
PLASTIC WASHER

BAĞLANTI ELEMANLARI

PIECE: 144



PART CODE: PLASTIC
BEVELED WASHHER

PIECE: 16



PART CODE: 40X60 MM
PROFILE COVER

PIECE: 12



PART CODE: 80X120 MM
PROFILE COVER

PIECE: 104



PART CODE: 12 MM HOLE
CAP

PIECE: 32



PART CODE: 10MM
ROOF SCREW

PIECE: 1



PART CODE: NET TENSION
DEVİCE

MONTAJ

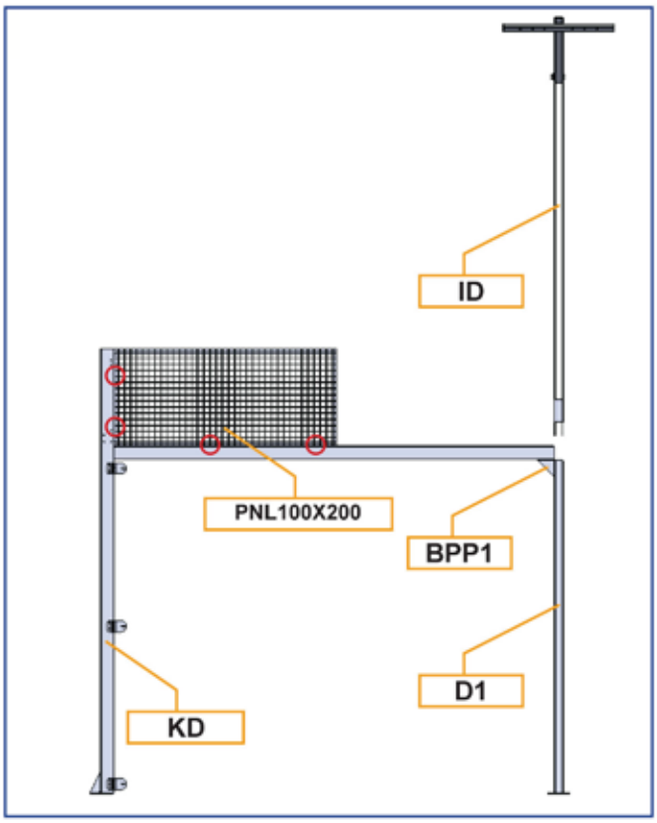

1 KD ve D1 direkleri M14x110 mm çelik dübellerle zemine sabitlenir; dübellerin son torklaması yapılmaz. PNL 100x200 panel BP1 profiline M10x160 mm cıvatalarla monte edilir. Montajda CTB2 parçaları da kullanılır. BP1, KD direğindeki mevcut deliklere M10x180 mm cıvatalarla bağlanır.

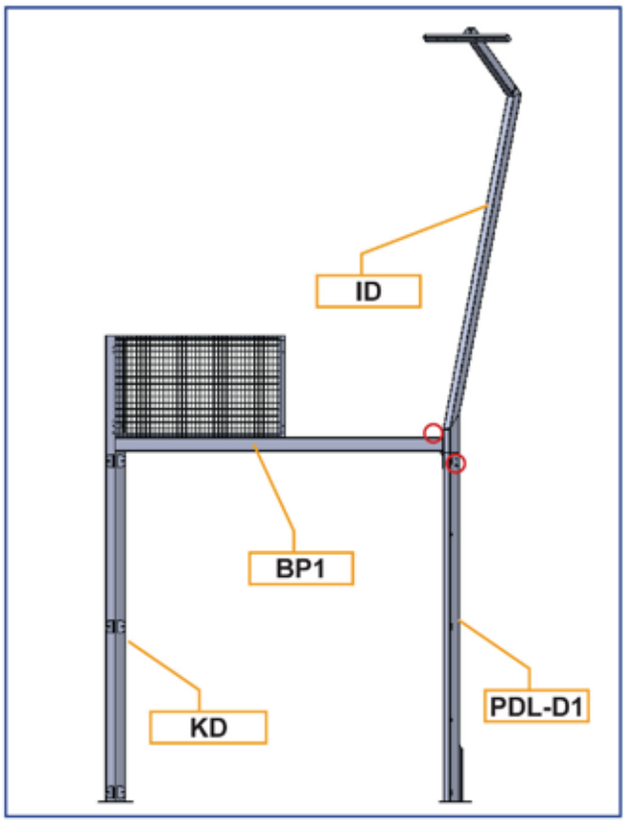

2 BP1, D1 direğine monte edilirken BPP1 ve ID parçalarında M10x100 mm cıvatalar kullanılır.

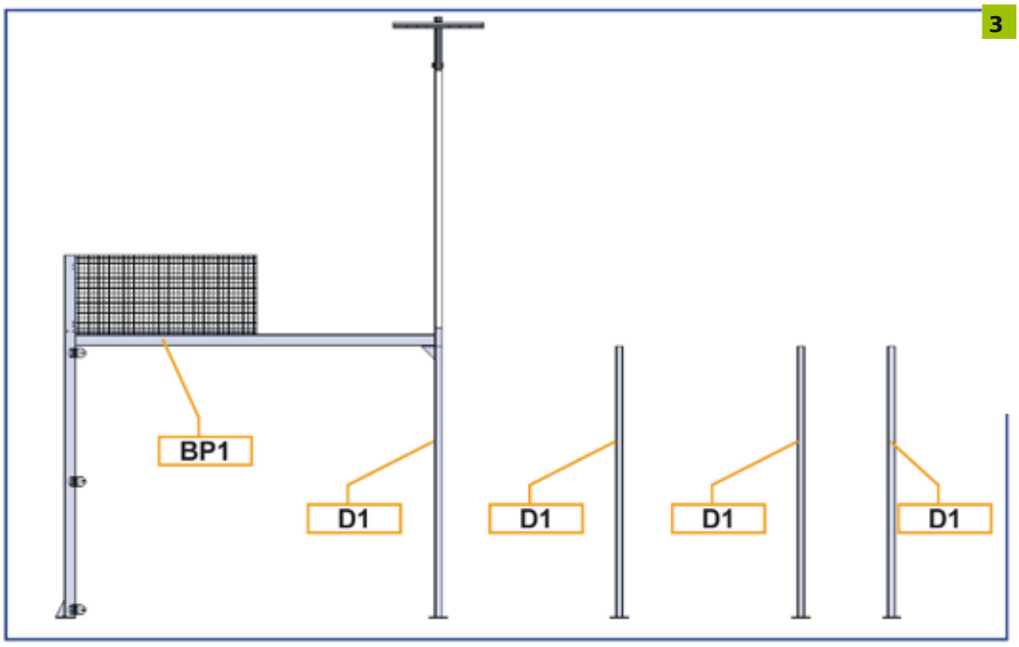

3 D1 direkleri M14x110 mm çelik dübellerle zemine sabitlenir. PNL 200x300 paneller için direkler arasında panel ölçüsüne uygun boşluk bırakılmalı, direk yönleri doğru olmalı ve direkler su terazisiyle kontrol edilmelidir. Direkler arasındaki paneller monte edilene kadar çelik dübellere son tork uygulanmamalıdır.

MONTAJ

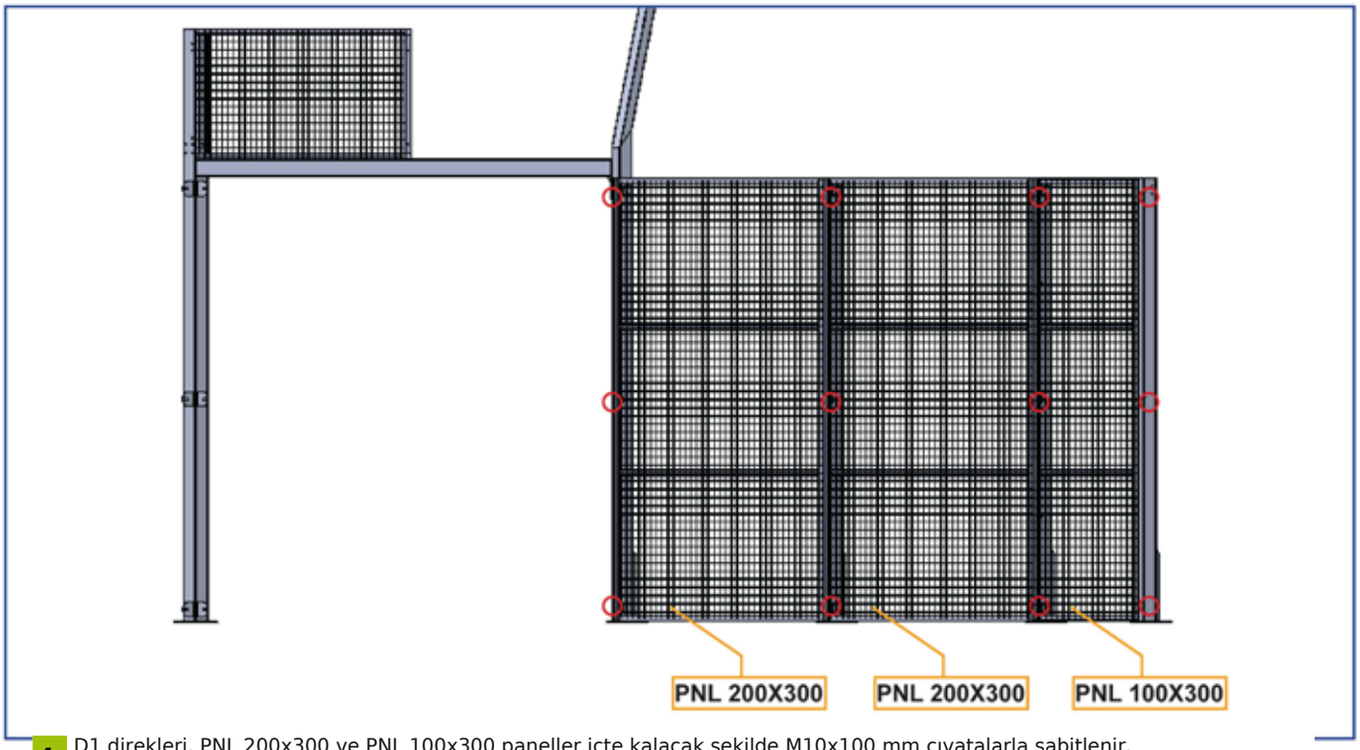

4 D1 direkleri, PNL 200x300 ve PNL 100x300 paneller içte kalacak şekilde M10x100 mm cıvatalarla sabitlenir.

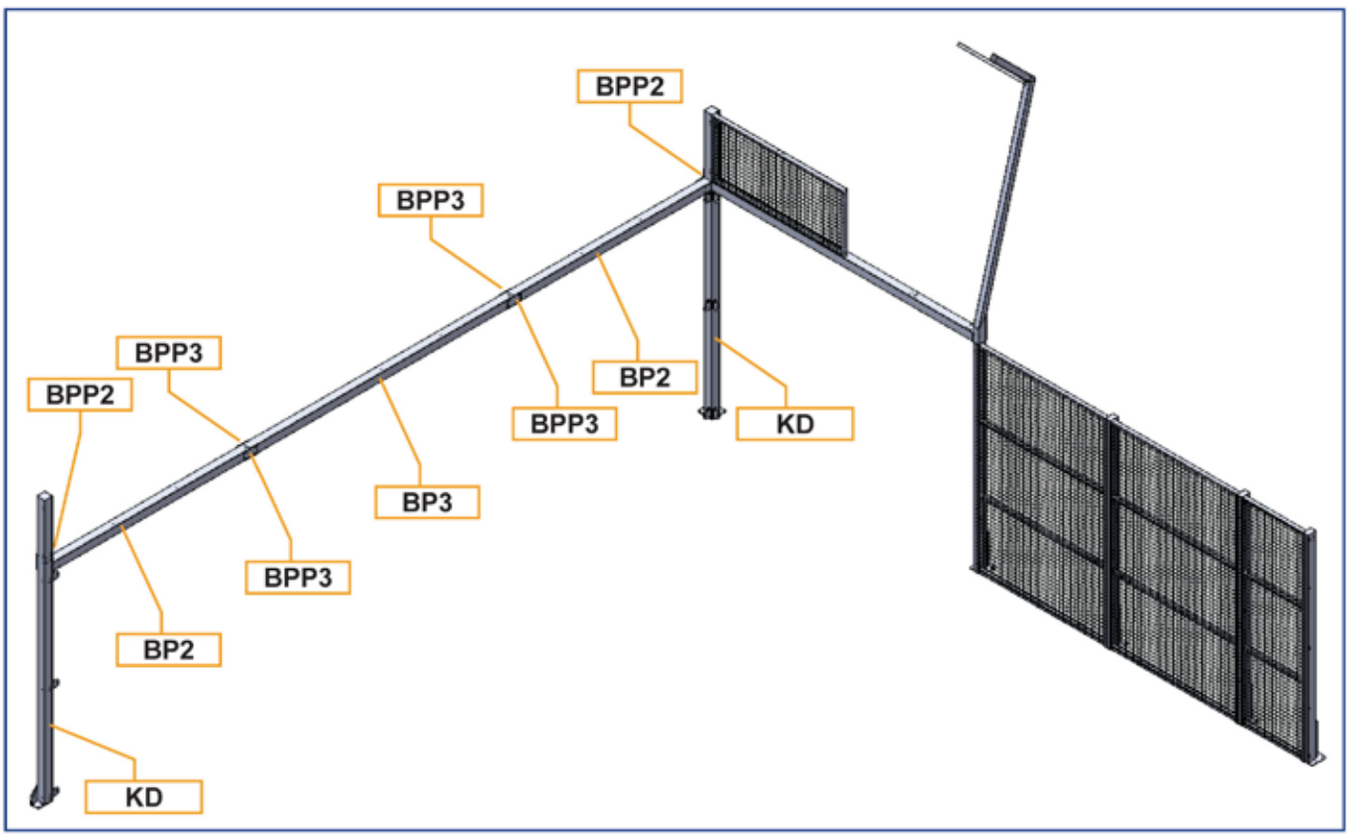

5 BP2 ve BP3 profilleri BPP3 plakaları ve M10x120 mm cıvatalarla birbirine monte edilir. Ardından BPP2 plakaları ve M10x140 mm cıvatalarla KD direklerine sabitlenir.

MONTAJ

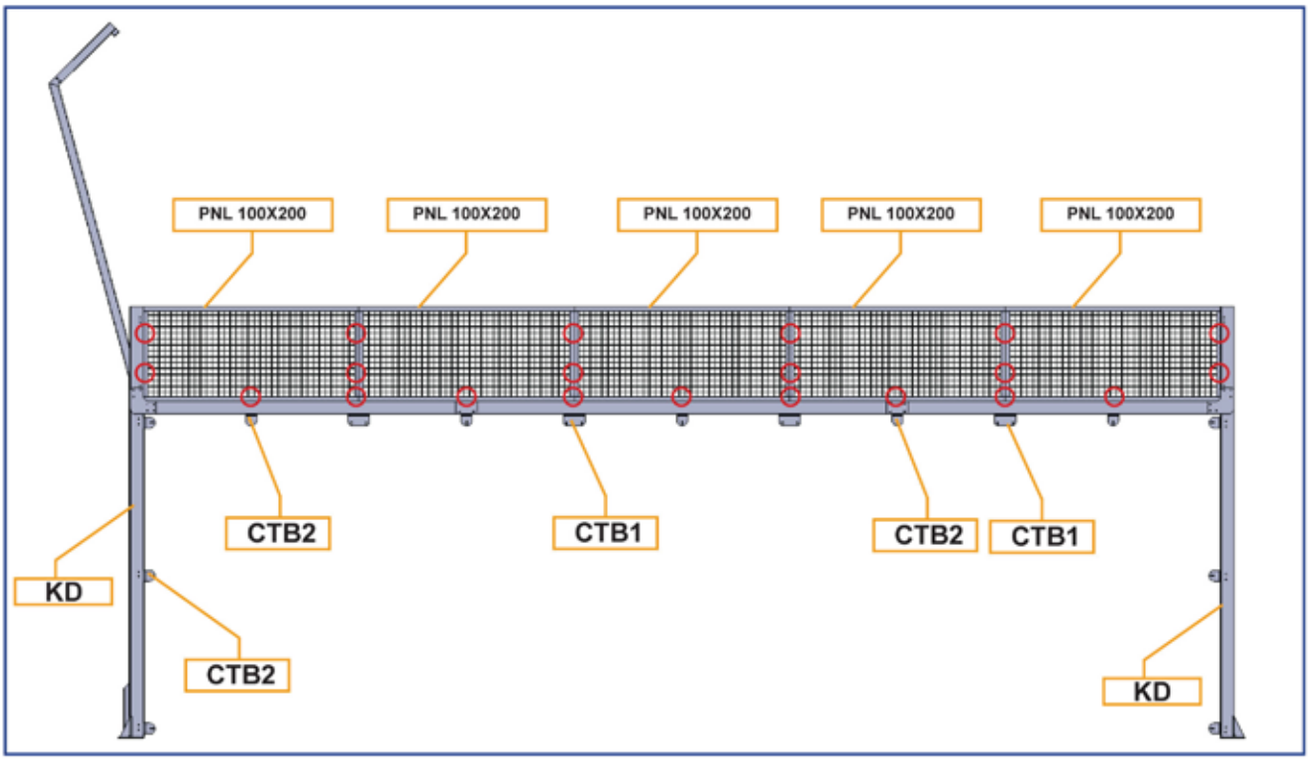

6 PNL 100x200 paneller KD profile M10x180 mm cıvatalarla sabitlenir. Paneller birbirine M10x100 mm cıvatalarla bağlanır. BP2 ve BP3 profillerinin panellerle montajında CTB1 ve CTB2 parçaları da kullanılır. Üç parça M10x160 mm cıvatalarla birbirine bağlanır.

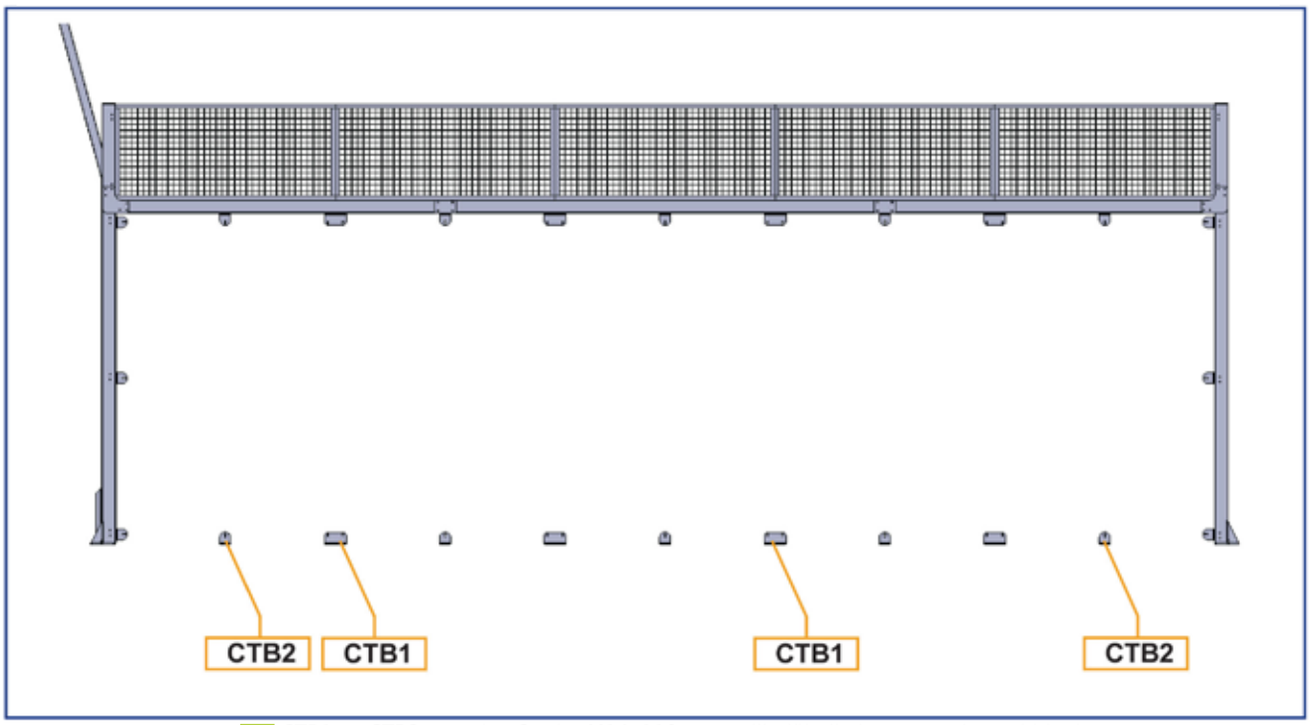

7 CTB1 ve CTB2 parçaları 2 adet M14x110 mm çelik dübelle beton zemine sabitlenir.

7 C

MONTAJ

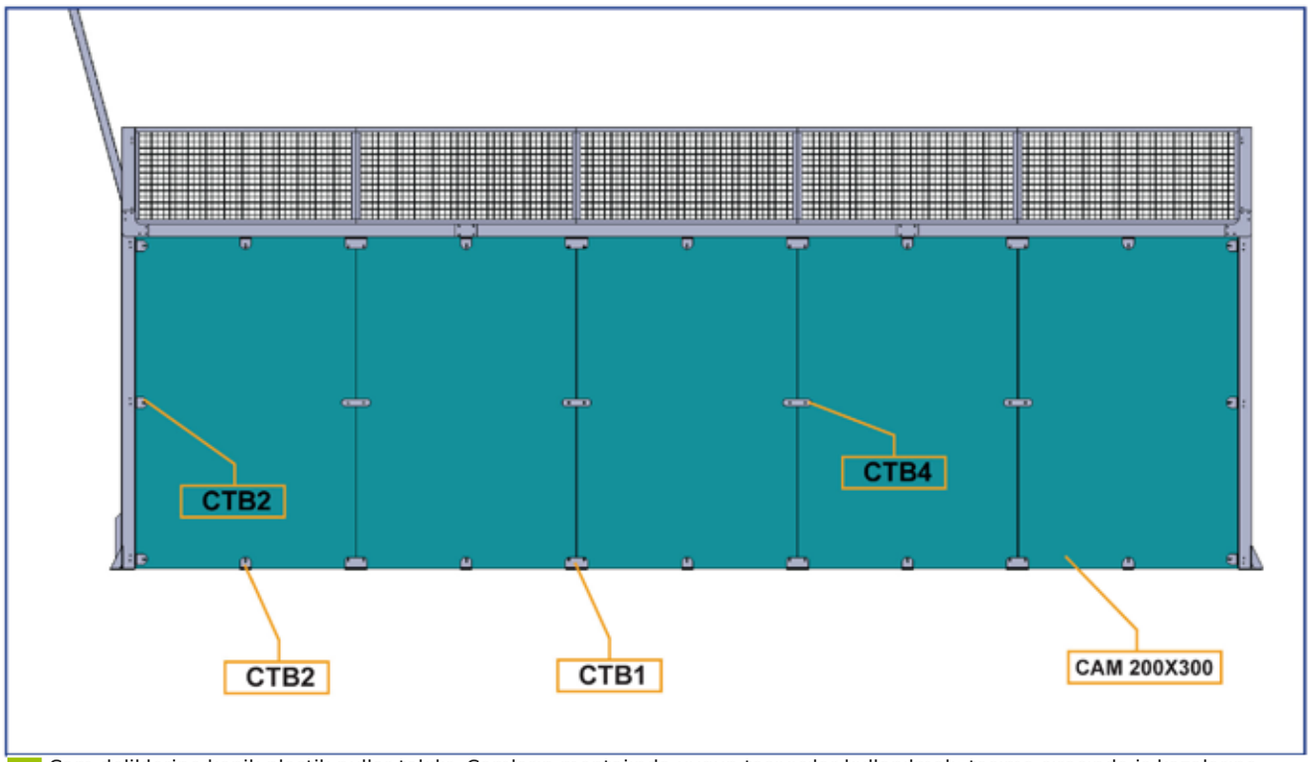

8 Cam deliklerine konik plastik pullar takılır. Camların montajında uygun taşıyıcılar kullanılmalı; taşıma sırasında iş kazalarına karşı dikkatli olunmalı ve uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır. Camlar, önceden monte edilmiş CTB1, CTB2 ve CTB3 parçalarına M10x30 mm havşa başlı cıvatalarla bağlanır. Yerleştirilen camlar CTB4 parçalarıyla birbirine sabitlenir.

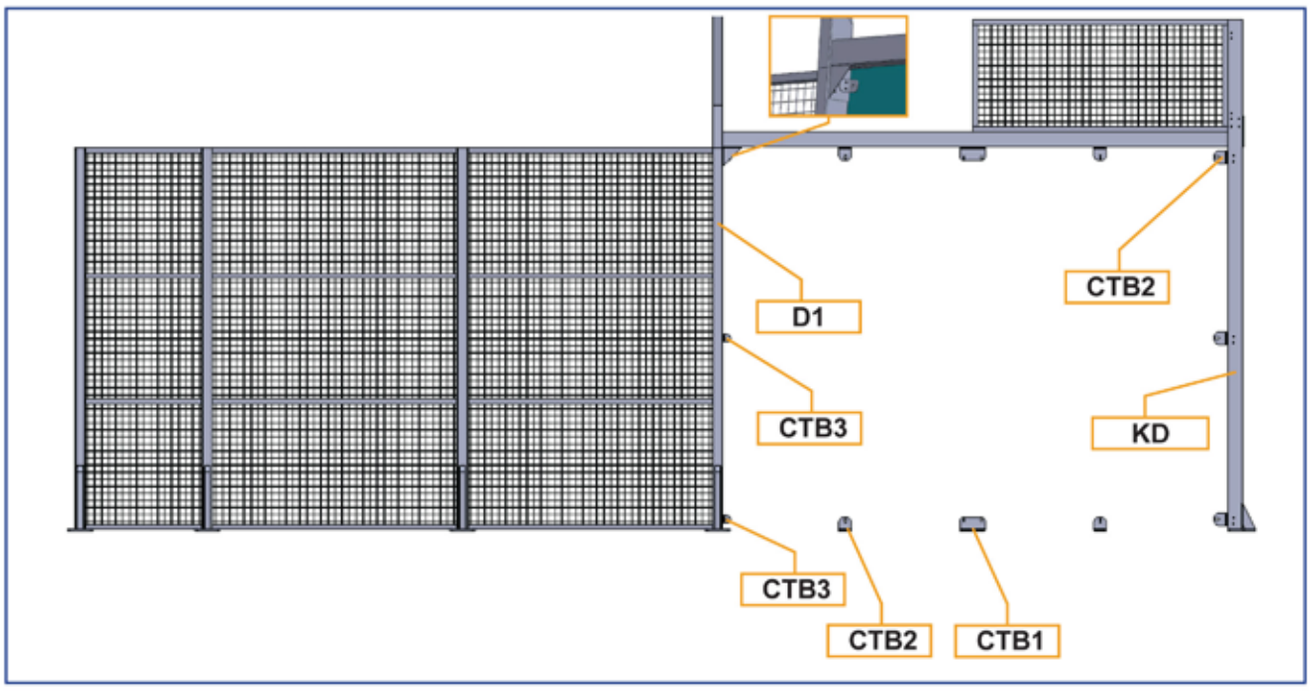

9 CTB1 ve CTB2 parçaları 2 adet M14x110 mm çelik dübelle beton zemine sabitlenir.

MONTAJ

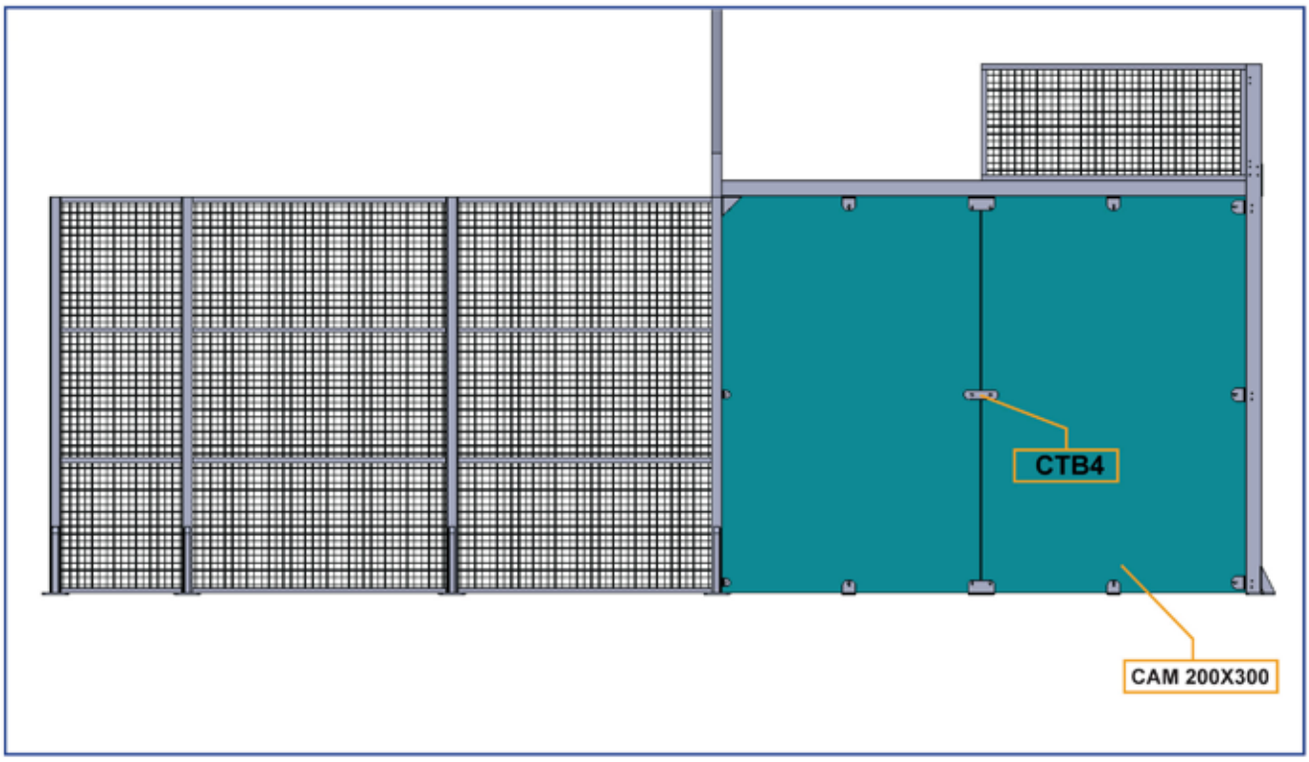

10 8 numaralı montajdaki işlemlerin aynısı uygulanır.

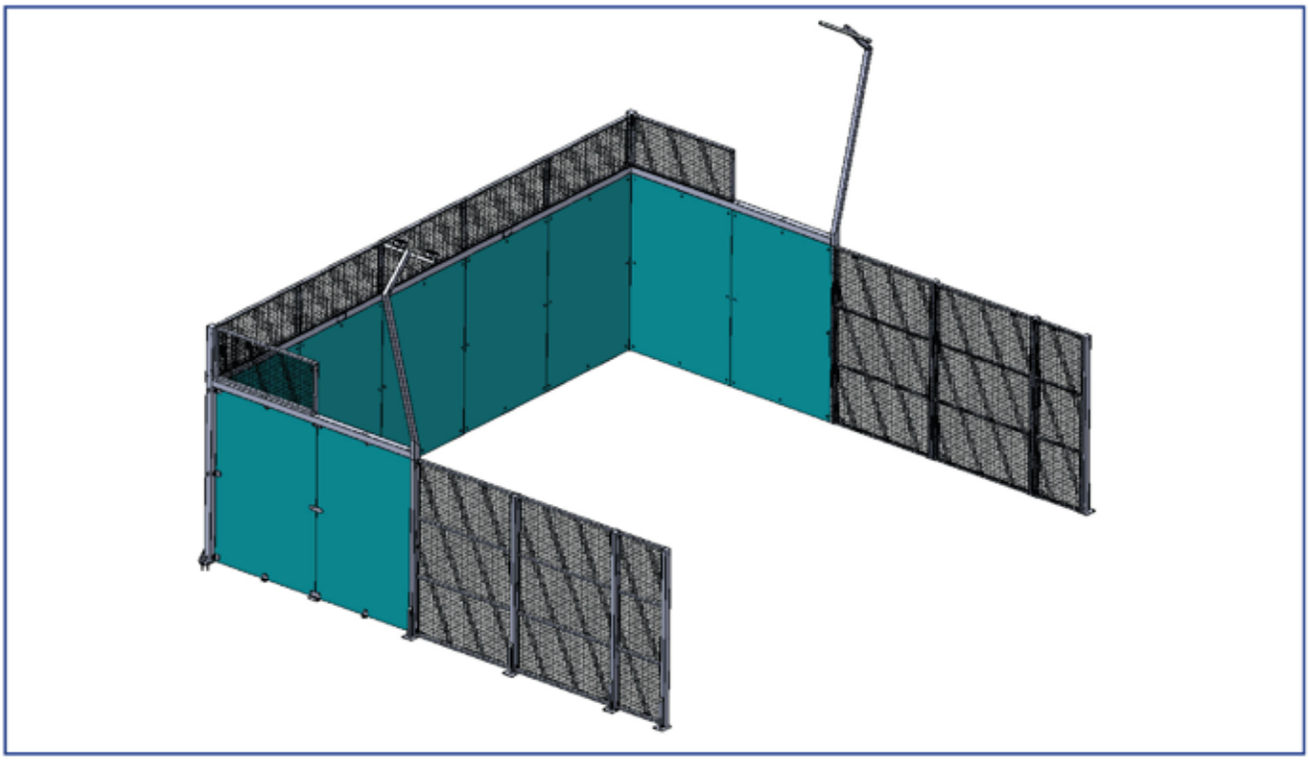

11 Bu aşamaya kadar yapılan tüm işlemler kontrol edilir. Sahanın simetri eksenine kadar olan montajı tamamlanmıştır. Bu aşamadan sonra aynı işlem tekrarlanır.

MONTAJ

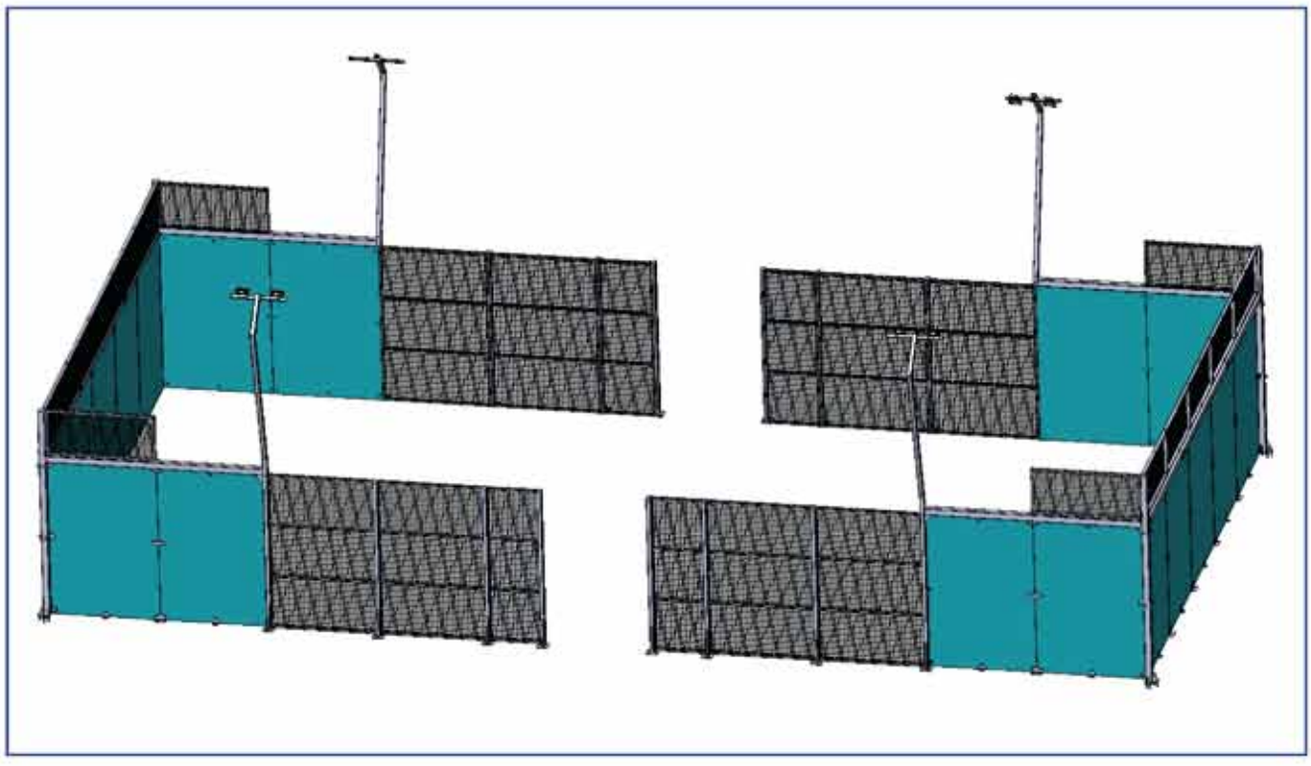

12 Aynı işlemler simetri ekseninde uygulanır ve montaja devam edilir.

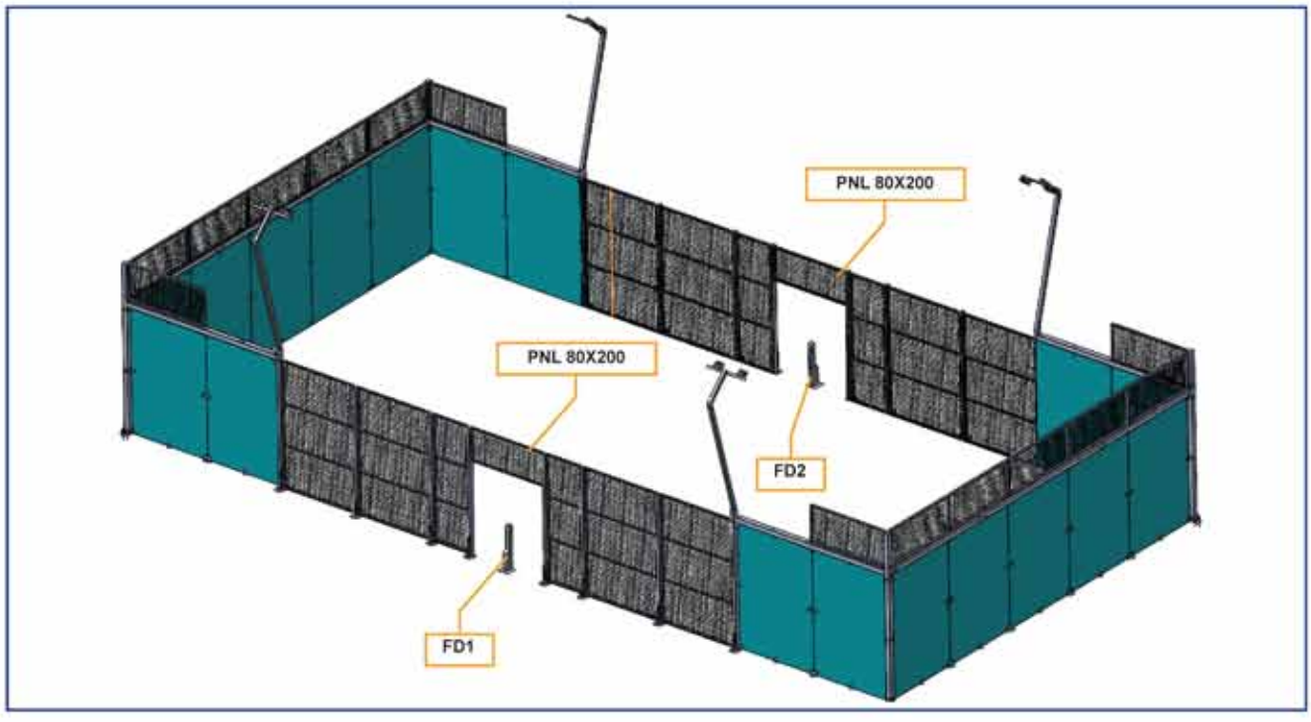

13 PNL 80x200 paneller D1 direklerine M10x100 mm cıvatalarla monte edilir. FD1 ve FD2 direkleri sahanın merkezine M14x110 çelik dübellerle sabitlenir. Sahanın montajı tamamlanmıştır. Halı serilmeden önce tüm bağlantılar yeniden kontrol edilmelidir.

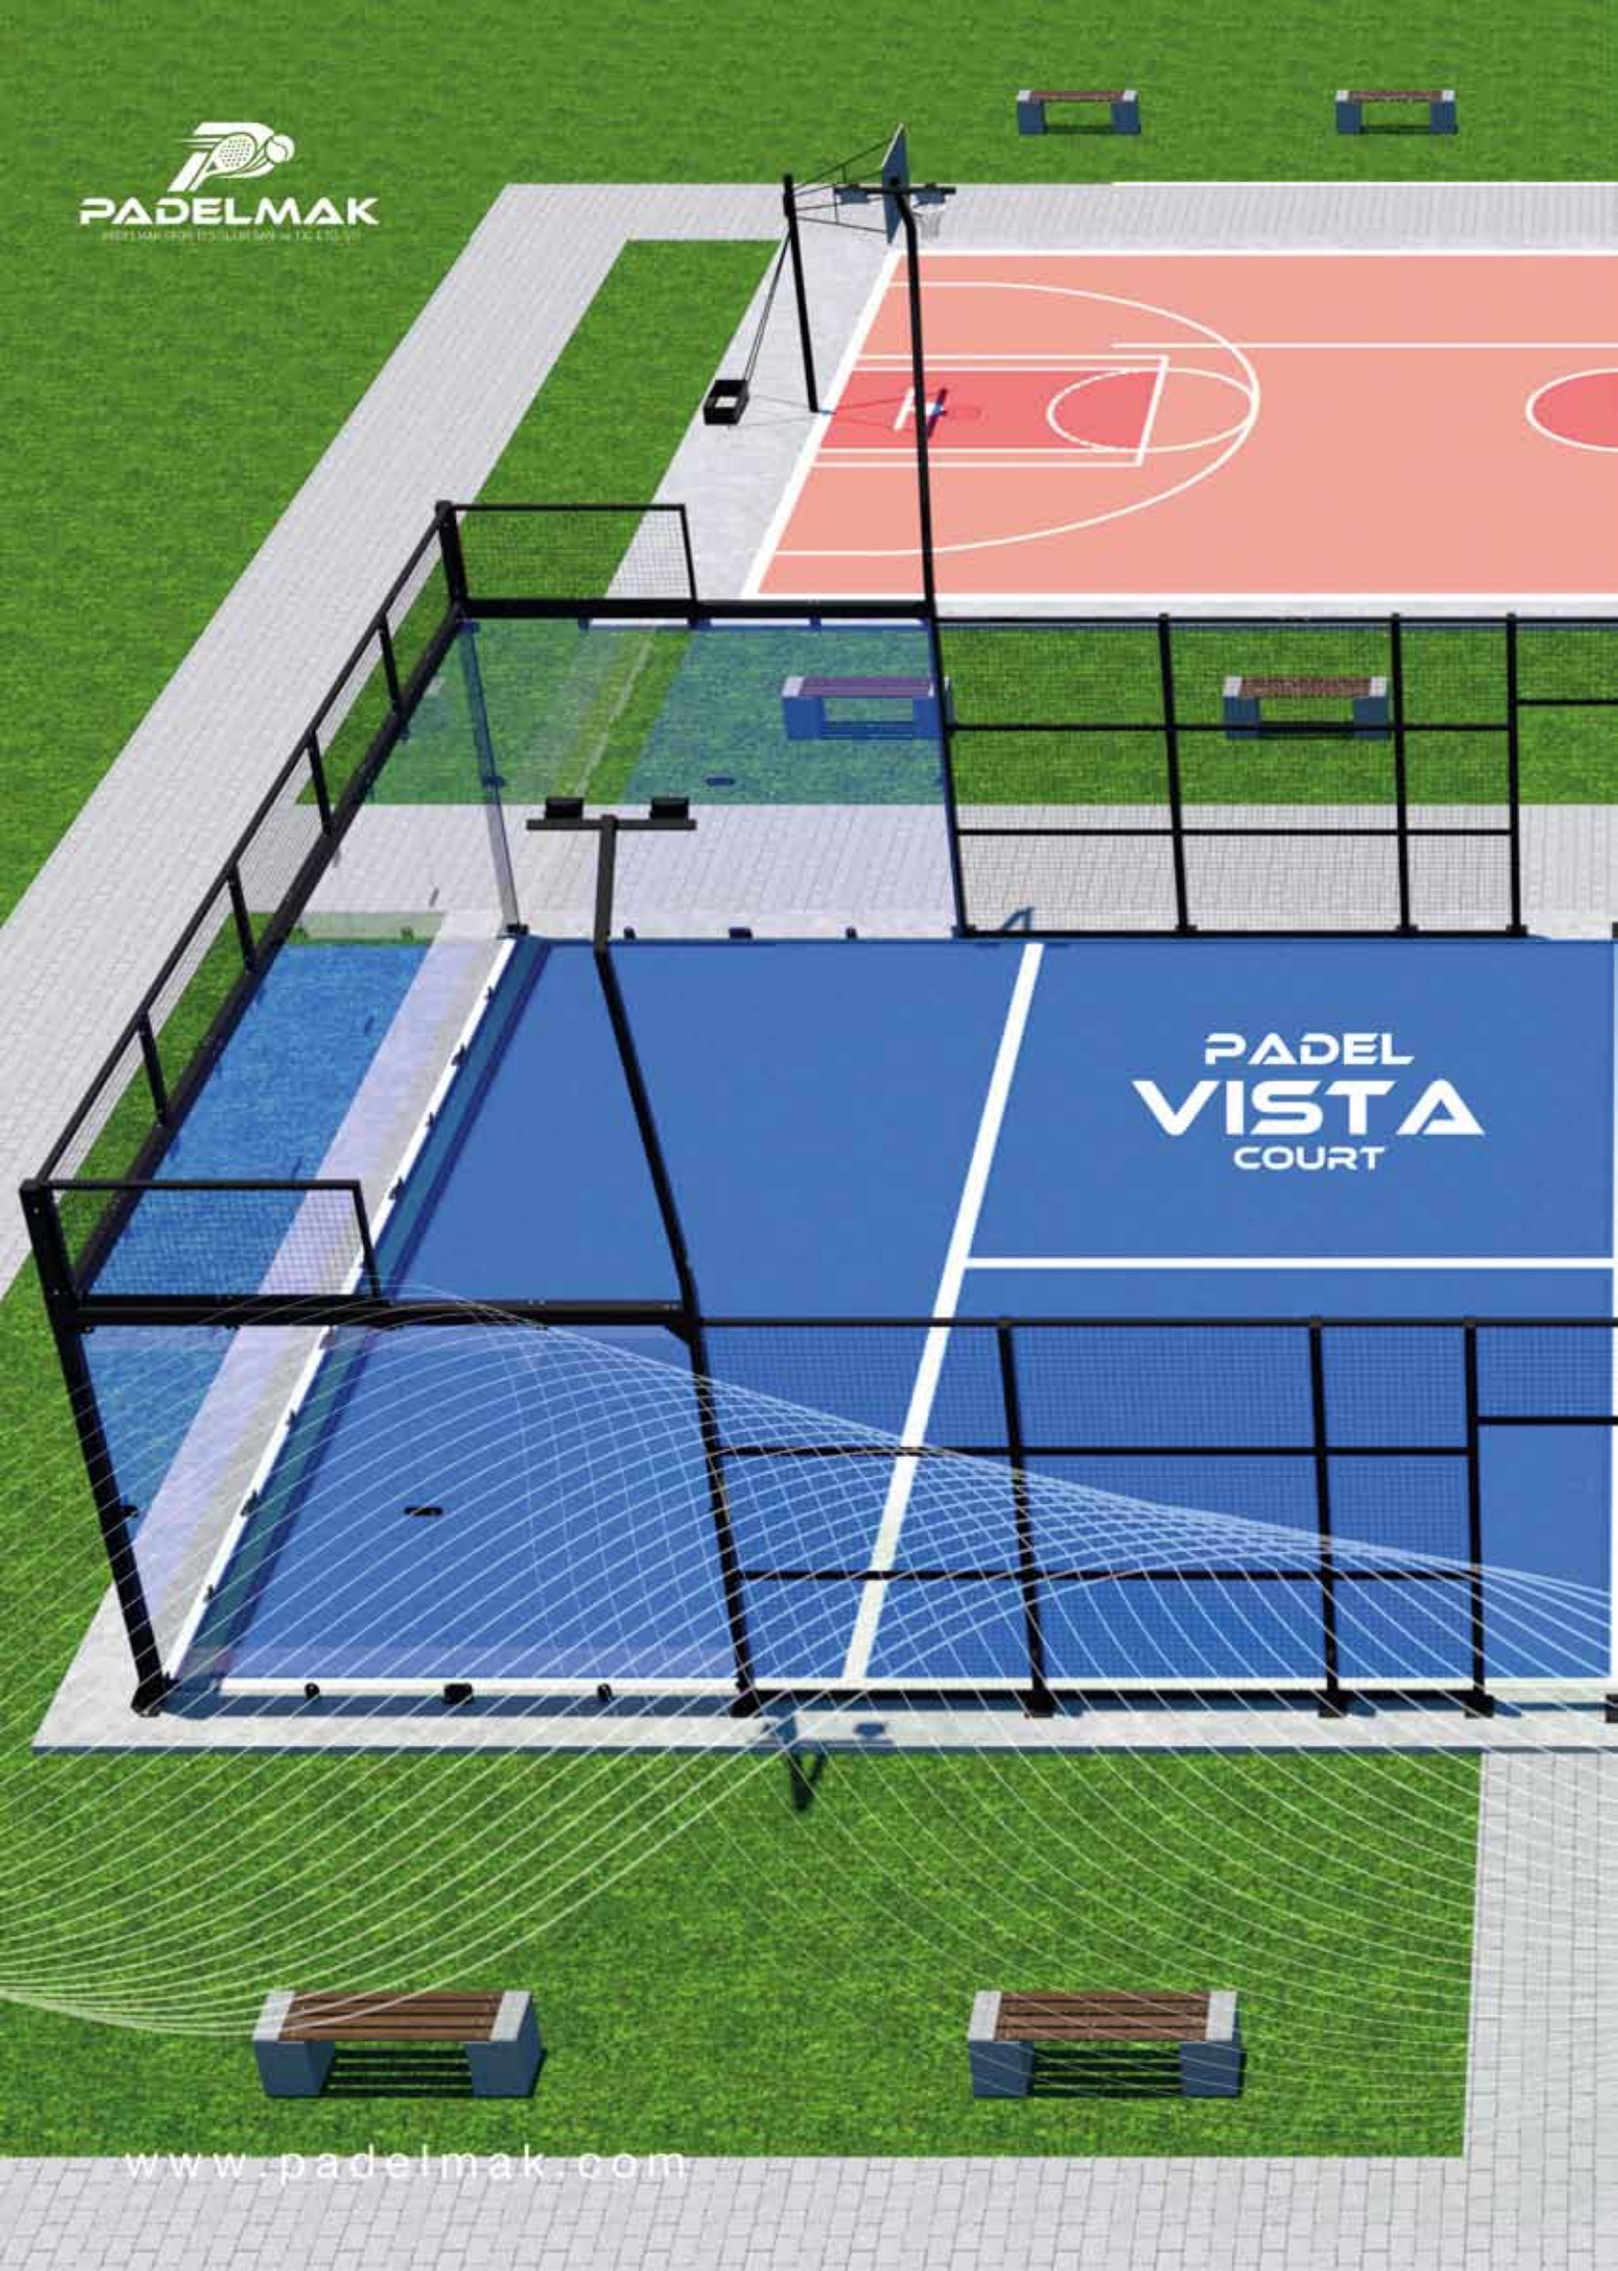

www.padelmak.com


PADELMAK
PADEL
VISTA
COURT
www.padelmak.com



PADELMAK

PADELMAK SPOR TESİSLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

www.padelmak.com

info@padelmak.com
